Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
09/09/2026 13:35
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΥ ΚΑΙ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2026»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 54/2026

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στο έργο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2026».**

Το έργο αφορά την εκτέλεση του συνόλου των απαιτούμενων τεχνικών εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα της **6ης Φεβρουαρίου 2026** στο δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Πηνειού, καθώς και στα συνοδά τεχνικά έργα απορροής ομβρίων.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αποσκοπούν στην επαναφορά των πληγεισών υποδομών σε κατάσταση ασφαλή, λειτουργική και τεχνικά επαρκή, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους έναντι μελλοντικών ακραίων υδρομετεωρολογικών φαινομένων.

Κύριος στόχος του είναι η άμεση αποκατάσταση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της βατότητας μέρους του δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Πηνειού με επείγουσες και προληπτικές παρεμβάσεις σε δημοτικές οδούς και χωματόδρομους, τάφρους, καθώς και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών σε μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα.

Με το έργο προβλέπονται:

- Καθαρισμοί οδών και παρόδοιων τάφρων
- Απομάκρυνση φερτών και αποτιθέμενων υλικών
- Ασφαλτόστρωση χωματόδρομων, επί στρώσεων οδοστρωσίας (βάσης και υπόβασης)
- Αποκατάσταση ασφαλτοταπήτων σε υφιστάμενες δημοτικές οδούς, κατόπιν φρεζαρίσματος
- Κατασκευή έργων για την βελτίωση απορροής ομβρίων των οδών με κατασκευή ρείθρων

Πιο συγκεκριμένα, η ασφαλτόστρωση 3 δημοτικών οδών στην Δ.Κ. Βαρθολομιού της Δ.Ε. Βαρθολομιού του δήμου Πηνειού, 2 δημοτικών οδών στην Δ.Κ. Γαστούνης της Δ.Ε. Γαστούνης του δήμου Πηνειού και 1 οδού στην Δ.Κ. Τραγανού της Δ.Ε. Τραγανού του Δ. Πηνειού, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών χρήσης και

προσβασιμότητας από τους κατοίκους και τους περαστικούς. Παράλληλα, πραγματοποιείται περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η χρονική περίοδος εκτέλεσής του ορίζεται σε **ΟΚΤΩ** μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η πρόοδος των εργασιών θα εξελιχθεί ως εξής:

Περιγραφή Εργασίας	Α/Α	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ
		(Μέρες)	(Μέρες)	(ΜΕΡΕΣ)
Υπογραφή Σύμβασης	1	15/5/2027	15/5/2027	0
Προετοιμασία εργοταξίου	2	15/5/2027	4/6/2027	20
Γενικές εκσκαφές	3	5/6/2027	20/7/2027	45
Καθαρισμός τάφρων	4	5/6/2027	20/7/2027	45
Ισοπέδωση grader	5	5/6/2027	20/7/2027	45
Τεχνικά έργα σκυροδέματος	6	21/7/2027	30/8/2027	40
Οπλισμοί	7	21/7/2027	30/8/2027	40
Προμήθεια δανείων	8	31/8/2027	4/12/2027	95
Κατασκευή Κρασπεδορείθρων	9	21/7/2027	30/8/2027	40
Επιχώματα	10	31/8/2027	4/12/2027	95
Υπόβαση	11	31/8/2027	4/12/2027	95
Βάση	12	31/8/2027	4/12/2027	95
Φρεζάρισμα	13	24/11/2027	8/1/2028	45
Προεπάλειψη/ Συγκολλητική	14	24/11/2027	8/1/2028	45
Ασφαλτική στρώση/ Σήμανση	15	24/11/2027	8/1/2028	45
Τελικοι έλεγχοι/εργαστηριακά	16	21/7/2027	14/1/2028	177
Παράδοση	17	15/1/2028	15/1/2028	0

ΆΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Στην περίπτωση που παρατηρηθεί καθυστέρηση για οποιουσδήποτε λόγους, θα χρησιμοποιηθεί πρόσθετος μηχανολογικός εξοπλισμός και ανθρώπινο δυναμικό, ούτως ώστε η εμπρόθεσμη περαίωση του έργου να είναι εφικτή.

Ασφάλεια & Υγεία

Τα θέματα ασφάλειας και υγείας ρυθμίζονται από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ε.Σ.Υ. και τα υπόλοιπα συμβατικά έγγραφα. Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, το οποίο θα υποβληθεί στην υπηρεσία, εξασφαλίζει την συνεχή παρακολούθηση

της λήψεως των απαραίτητων μέτρων και την αντιμετώπιση κατά το δυνατόν του κινδύνου ατυχημάτων.

Προστασία περιβάλλοντος
Κατά την κατασκευή του έργου θα εφαρμοστούν οι εγκεκριμένες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και ισχύουσα νομοθεσία στα θέματα Περιβάλλοντος. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας παρακολουθεί την τήρησή της.

Έλεγχοι & δοκιμές
Οι έλεγχοι και οι δοκιμές που εκτελούνται μέσα ή έξω από το εργοτάξιο, εκτελούνται σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Διασφάλιση Ποιότητας
Για την διασφάλιση ποιότητας θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και το οριζόμενα στην ΕΣΥ.

Γαστούνη 27-07-2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περ/ντος
Διεύθυνση: Γ. Γιαννακοπούλου & Χριστόφ. Αγγέλου
Γαστούνη
Τ.Κ.: 27300
τηλ: 2623 360732- 731
e-mail: dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr


Έργο: **"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2026"**

ΑΡ. ΜΕΛ: **54/26**

Προϋπολογισμός: **876.644,11 €** (Με Φ.Π.Α. 24%)
CPV: 45233120-6 Έργα οδοποιίας
45233142-6 - Εργασίες επισκευής οδών

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Περιγραφή Εργασίας	Α/Α	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ
		(Μέρες)	(Μέρες)	(ΜΕΡΕΣ)
Υπογραφή Σύμβασης	1	15/5/2027	15/5/2027	0
Προετοιμασία εργοταξίου	2	15/5/2027	4/6/2027	20
Γενικές εκσκαφές	3	5/6/2027	20/7/2027	45
Καθαρισμός τάφρων	4	5/6/2027	20/7/2027	45
Ισοπέδωση grader	5	5/6/2027	20/7/2027	45
Τεχνικά έργα σκυροδέματος	6	21/7/2027	30/8/2027	40
Οπλισμοί	7	21/7/2027	30/8/2027	40
Προμήθεια δανείων	8	31/8/2027	4/12/2027	95
Κατασκευή Κρασπεδορείθρων	9	21/7/2027	30/8/2027	40
Επιχώματα	10	31/8/2027	4/12/2027	95
Υπόβαση	11	31/8/2027	4/12/2027	95
Βάση	12	31/8/2027	4/12/2027	95
Φρεζάρισμα	13	24/11/2027	8/1/2028	45
Προεπάλειψη/ Συγκολλητική	14	24/11/2027	8/1/2028	45
Ασφαλτική στρώση/ Σήμανση	15	24/11/2027	8/1/2028	45
Τελικοι έλεγχοι/εργαστηριακά	16	21/7/2027	14/1/2028	177
Παράδοση	17	15/1/2028	15/1/2028	0

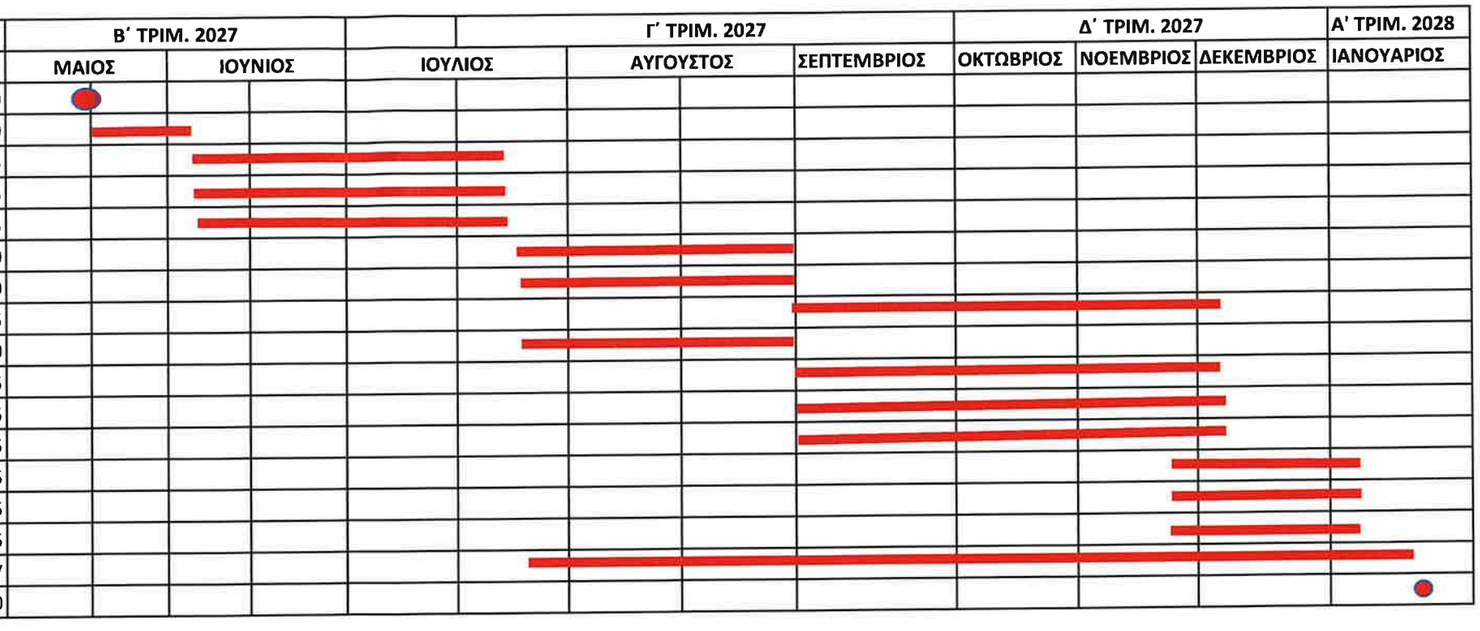

Γαστούνη 27/07/2026
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γαστούνη 27/07/2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc.
ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ
