ΠΡΟΙΣΤΑΜ Δ/ΝΣΗΣ
NIKOLETTA KOKKALIARI
13/5/2026 11:09
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΚΑΙ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Α΄ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ » ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 35/25 (ΟΡΙΣΤΙΚΗ)

Δ/ΝΣΗ ΤΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ

23/12/2025

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΚΑΙ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Α' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ"

ΑΡ. ΜΕΛ: 35/2025 (ΟΡΙΣΤΙΚΗ)

ΠΡ/ΜΟΣ: 980.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΧΗ (μέρες)	ΛΗΞΗ (μέρες)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μέρες)
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ	**1/9/2026**	**27/8/2027**	**360**
1	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1/9/2026	1/9/2026	0
2	ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡ/ΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	15/9/2026	30/9/2026	15
	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ			
3	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ-ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΛΗΨΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	2/9/2026	30/9/2026	28
4	ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	1/10/2026	30/10/2026	29
5	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	1/10/2026	30/10/2026	29
6	ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ	20/9/2026	31/5/2027	253
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ			
7	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ	1/10/2026	20/10/2026	19
8	ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ	10/10/2026	20/10/2026	10
9	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ	21/10/2026	10/11/2026	20
10	ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ	21/10/2026	10/11/2026	20
11	ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ	10/11/2026	20/11/2026	10
12	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ	21/11/2026	20/12/2026	29
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ			
13	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΤΕΓΗΣ	21/12/2026	20/1/2027	30
14	ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	21/1/2027	10/2/2027	20
15	ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΗ	11/2/2027	28/2/2027	17
16	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	20/2/2027	10/3/2027	18
17	ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ	1/3/2027	20/3/2027	19
	ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
18	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ	2/1/2027	20/1/2027	18
19	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	21/1/2027	30/6/2027	160
20	ΚΑΤΩΦΛΙΑ & ΠΟΔΙΕΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1/2/2027	31/3/2027	58
21	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ WC ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ	1/2/2027	31/3/2027	58
22	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΘΥΡΩΝ -ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ - ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)	1/3/2027	30/6/2027	121
23	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ	20/3/2027	20/4/2027	31
24	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	20/1/2027	20/2/2027	31
25	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ (ΙΣΧΥΡΑ- ΑΣΘΕΝΗ)	20/1/2027	28/2/2027	39

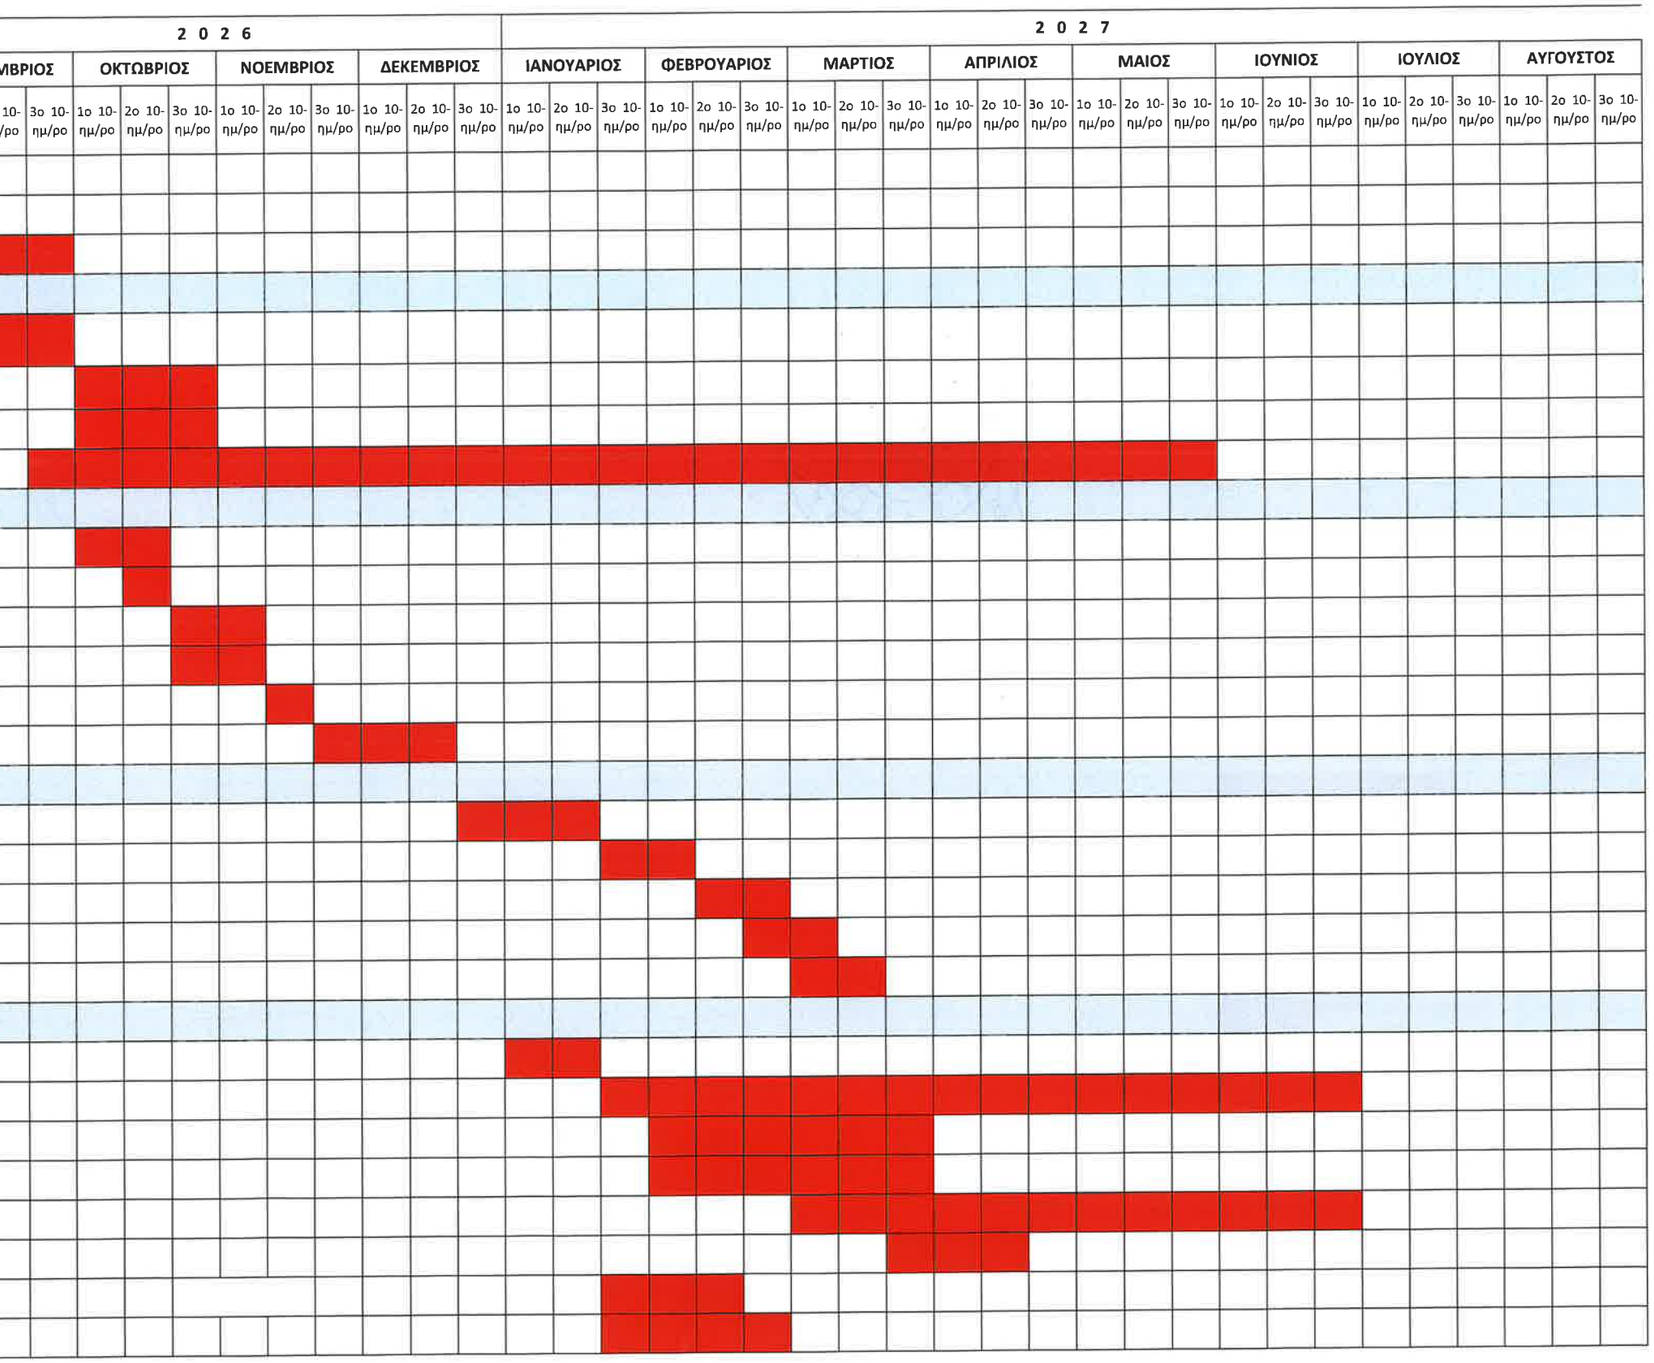

	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ	360 ΜΕΡΕΣ			2 0 2 6												2 0 2 7																							
					ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ			ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ			ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ			ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ			ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ			ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ			ΜΑΡΤΙΟΣ			ΑΠΡΙΛΙΟΣ			ΜΑΙΟΣ			ΙΟΥΝΙΟΣ			ΙΟΥΛΙΟΣ			ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ		
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΧΗ (μέρες)	ΛΗΞΗ (μέρες)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μέρες)	1ο 10-ημ/ρο	2ο 10-ημ/ρο	3ο 10-ημ/ρο	1ο 10-ημ/ρο	2ο 10-ημ/ρο	3ο 10-ημ/ρο	1ο 10-ημ/ρο	2ο 10-ημ/ρο	3ο 10-ημ/ρο	1ο 10-ημ/ρο	2ο 10-ημ/ρο	3ο 10-ημ/ρο	1ο 10-ημ/ρο	2ο 10-ημ/ρο	3ο 10-ημ/ρο	1ο 10-ημ/ρο	2ο 10-ημ/ρο	3ο 10-ημ/ρο	1ο 10-ημ/ρο	2ο 10-ημ/ρο	3ο 10-ημ/ρο	1ο 10-ημ/ρο	2ο 10-ημ/ρο	3ο 10-ημ/ρο	1ο 10-ημ/ρο	2ο 10-ημ/ρο	3ο 10-ημ/ρο	1ο 10-ημ/ρο	2ο 10-ημ/ρο	3ο 10-ημ/ρο	1ο 10-ημ/ρο	2ο 10-ημ/ρο	3ο 10-ημ/ρο	1ο 10-ημ/ρο	2ο 10-ημ/ρο	3ο 10-ημ/ρο
26	ΔΙΚΤΥΟ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ)	20/1/2027	28/2/2027	39																																				
27	ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	20/1/2027	28/2/2027	39																																				
28	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1/5/2027	31/5/2027	30																																				
29	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	1/5/2027	31/5/2027	30																																				
30	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	1/6/2027	20/6/2027	19																																				
31	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	1/6/2027	30/6/2027	29																																				
32	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ	1/7/2027	10/8/2027	40																																				
	ΑΥΛΕΙΟΣ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ																																							
33	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ/ ΑΡΔΡΕΥΣΗ	1/4/2027	20/5/2027	49																																				
34	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	1/4/2027	30/5/2027	59																																				
35	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΥΛΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ	1/6/2027	20/7/2027	49																																				
36	ΔΟΚΙΜΕΣ	10/8/2027	20/8/2027	10																																				
37	ΠΑΡΑΔΟΣΗ	20/8/2027	**27/8/2027**	7																																				

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΑΣΤΟΥΝΗ 23 /12 / 2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.Sc.

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'
